Contrôle de la radioactivité de l'eau du Rhône
Balise d'Avignon (Vaucluse)

Janvier 2022

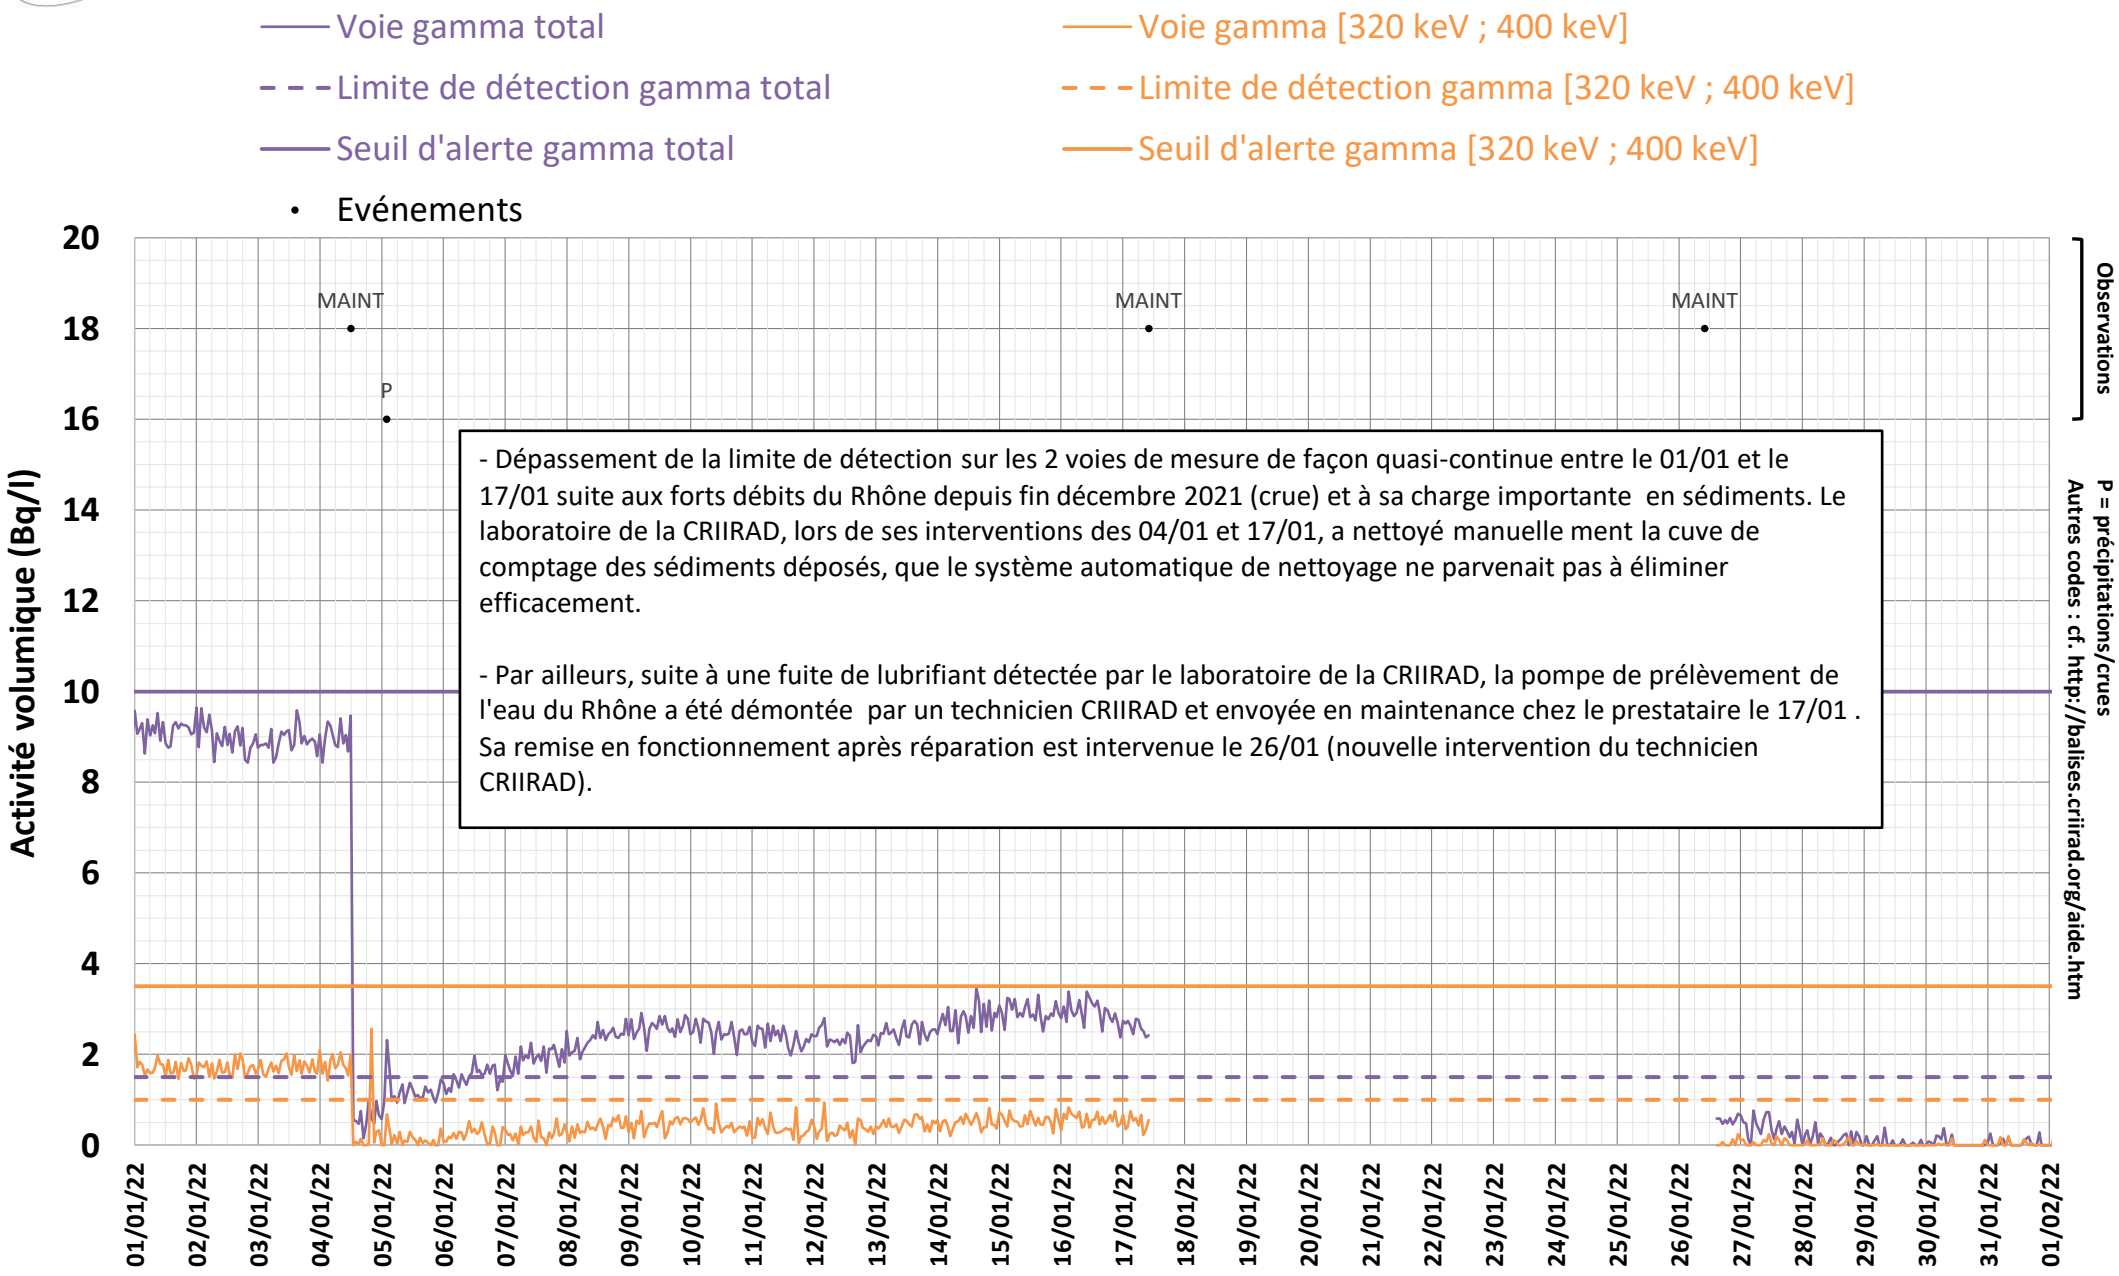

- Dépassement de la limite de détection sur les 2 voies de mesure de façon quasi-continue entre le 01/01 et le 17/01 suite aux forts débits du Rhône depuis fin décembre 2021 (crue) et à sa charge importante en sédiments. Le laboratoire de la CRIIRAD, lors de ses interventions des 04/01 et 17/01, a nettoyé manuelle ment la cuve de comptage des sédiments déposés, que le système automatique de nettoyage ne parvenait pas à éliminer efficacement.

- Par ailleurs, suite à une fuite de lubrifiant détectée par le laboratoire de la CRIIRAD, la pompe de prélèvement de l'eau du Rhône a été démontée par un technicien CRIIRAD et envoyée en maintenance chez le prestataire le 17/01 . Sa remise en fonctionnement après réparation est intervenue le 26/01 (nouvelle intervention du technicien CRIIRAD).
